



*Il Commissario Straordinario
delegato all'attuazione degli interventi
di mitigazione del rischio idrogeologico*



Regione
Lombardia



Parco Regionale
Valle del Lambro



LIFE11 ENV/IT/004

Comuni di Inverigo (CO), Nibionno (LC) e Veduggio con Colzano (MB)



AREA DI LAMINAZIONE DI INVERIGO

INTERVENTI IDRAULICI E DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE NEI TERRITORI DI INVERIGO, NIBIONNO E VEDUGGIO CON COLZANO

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

Mandante:

ADRIACOS S.r.l.

P.IVA. : 01997520307

Via Giovanni Agnelli, 2
Latisana (UD)



Mandatarie:

NAGOSTINIS S.r.l.

P.IVA. : 01894310307

Piazza Venezia, 21
Villa Santina (UD)

B.B. SERVICE S.r.l.

P.IVA. : 02442870305

Via Selet, 5
Tolmezzo (UD)

PROFESSIONISTI INCARICATI

R.T.P.

CAPOGRUPPO:



Studio Causero & Spadetto Associati
ingegneria civile idraulica ambientale

dott. ing. Mario Causero

dott. ing. Paolo Spadetto

Via Luigi Moretti, 15 - Udine

ASPETTI GEOLOGICI:

dott. geol. Roberto Ponta

ASPETTI AMBIENTALI:

dott. for. Massimo Cainero

dott. nat. Matteo De Luca

ASPETTI PAESAGGISTICI:

dott. arch. Loris Forte

Data:
dicembre 2016

Agg:

Scala:

File: valle lambro


PROGETTO ESECUTIVO CRONOPROGRAMMA

documento
I

1.0 Cronoprogramma delle lavorazioni

Si stima, per la realizzazione degli interventi in progetto, una durata del cantiere di 360 giorni naturali consecutivi.

2.1 Diagramma di Gantt

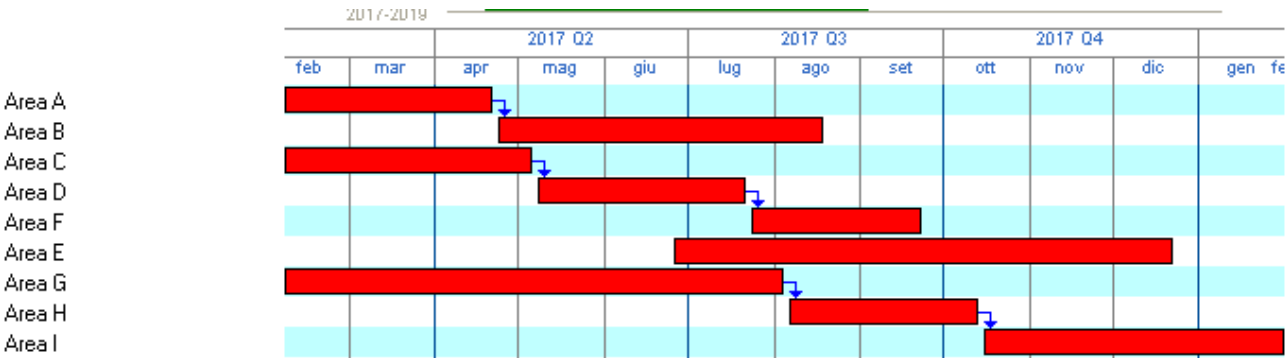

Attività	Inizio	Fine	Durata	Note
Area A	06/02/2017	21/04/2017	75	
Area B	24/04/2017	18/08/2017	117	
Area C	06/02/2017	05/05/2017	89	
Area D	08/05/2017	21/07/2017	75	
Area F	24/07/2017	22/09/2017	61	
Area E	26/06/2017	22/12/2017	180	
Area G	06/02/2017	04/08/2017	180	
Area H	07/08/2017	13/10/2017	68	
Area I	16/10/2017	31/01/2018	108	
